Informe Final
Plan de Mejoramiento

Ministerio de Educación

Gobierno de Chile

Modernización de la gestión de los servicios bibliográficos y espacios de estudio de la Biblioteca Central de la UMCE

Objetivo General del Proyecto: Modernizar la gestión de los servicios asociados a los recursos bibliográficos para mejorar la atención a los usuarios y permitir a docentes y alumnos acceder a recursos bibliográficos digitales las 24 horas del día durante toda la semana, incluso desde fuera del campus.

Informe de Cierre Proyecto FDI General 2015
Modernización de Procesos

Universidad Metropolitana de Ciencias de la educación

Modernización de la gestión de los servicios bibliográficos y espacios de estudio de la Biblioteca Central de la UMCE

FDI 1506

Período de ejecución: Fecha de inicio legal, *01/04/2016* - **Fecha de cierre** *01/04/2017*
Fecha de presentación del informe: *27/06/2017*

DIRECTOR Y EQUIPO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Nombre	Cargo en la Institución	Cargo en PM	Horas/mes asignadas a PM	Fono	Correo-e
Bruno Contreras	Director Biblioteca UMCE	Coordinador Proyecto (Director)	20	22412470	bruno.contreras@umce.cl
Leonel Durán	Director de Administración	Coordinador Administrativo (Director Alterno)	15	22412556	leonel.duran@umce.cl
Pablo Lepe	Jefe Infraestructura	Encargado Infraestructura	20	22412438	pablo.lepe@umce.cl
Alfredo Blanco	Arquitecto	Supervisor y Diseño de Obras		22412581	alfredo.blanco@umce.cl

EQUIPO RESPONSABLE DE MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO EN LA INSTITUCIÓN

Nombre	Cargo en la Institución	Cargo en PM	Horas/mes asignadas a PM	Fono	Correo-e
César Marilaf	Director de Planificación y Presupuesto	UCI – seguimiento global de ejecución	8	222412519	cesar.marilaf@umce.cl
Jeannette Herrera	UCI	Encargada procesos administrativos financieros convenios	8	222412715	jeannette.herrera@umce.cl

Objetivo Específico 1: : Modernizar la gestión de los servicios asociados a los recursos bibliográficos de la Biblioteca Central UMCE

Hitos – Objetivo Específico 1						
Descripción Hito / Actividades (según formulación del Proyecto)	Fecha programada para término actividad cumplimiento de hito		Fecha cumplimiento EFECTIVA para término actividad Cumplimiento de hito (señalar semestre)		Logrado a la fecha de término Señalar: SI, NO	Medios de Verificación definidos en Proyecto
	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2		
HITO **Plataforma computacional implementada**						
- Actividad Validación del estudio de requerimientos.	X		X		SI	Informe de análisis y requerimientos
- Actividad Cotización, compra e instalación del software Horizonte de automatización. Migración de base de datos	X			X	SI	Software Horizonte de automatización adquirido
- Actividad Interconexión de bibliotecas periféricas con Biblioteca Central		X		X	SI	Reporte de consultas y préstamos de las bibliotecas departamentales
- Actividad Inicio marcha blanca		X		X	SI	Pruebas de Implementación
- Actividad Evaluación del funcionamiento del sistema actualizado		X			NO	Encuesta de uso en línea
HITO **Recursos de información en línea implementados**						
- Actividad Validación del estudio de requerimientos	X		X		SI	Informe de análisis y requerimientos
- Actividad Cotización, compra y conexión del sistema de información y base de datos bibliográfica.	X	X	X		SI	Suscripción a base de datos de libros electrónicos
- Actividad Interconexión de bibliotecas periféricas con los recursos de información en línea.		X		X	SI	Reporte estadístico de consultas
- Actividad Inicio marcha blanca		X		X	SI	Pruebas de implementación
- Actividad Inducción de usuarios a nuevos servicios		X		X	SI	Informe de desarrollo de acciones de inducción
- Actividad Evaluación de satisfacción y uso de los recursos bibliográficos en línea		X			NO	Encuesta de satisfacción de uso del recurso

Análisis cualitativo del avance del Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 1 ha sido logrado plenamente. Tan solo cabe indicar que dos actividades aún no se han desarrollado por cuanto se relacionan con el uso de los servicios, para ello se requiere un tiempo mayor para aplicar las encuestas de satisfacción de uso del recurso adquirido.

Al inicio consideramos contratar acceso a 500 títulos de libros electrónicos, se ha logrado contratar una plataforma de 30.000 títulos, de las cuales 3.000 son de la especialidad educación.

Consideramos 2.350 bajadas de libros desde la plataforma en un periodo lectivo de 8 meses, sin embargo a tan solo 1 mes de conexión ya se han realizado 1.274 bajadas de textos especializados.

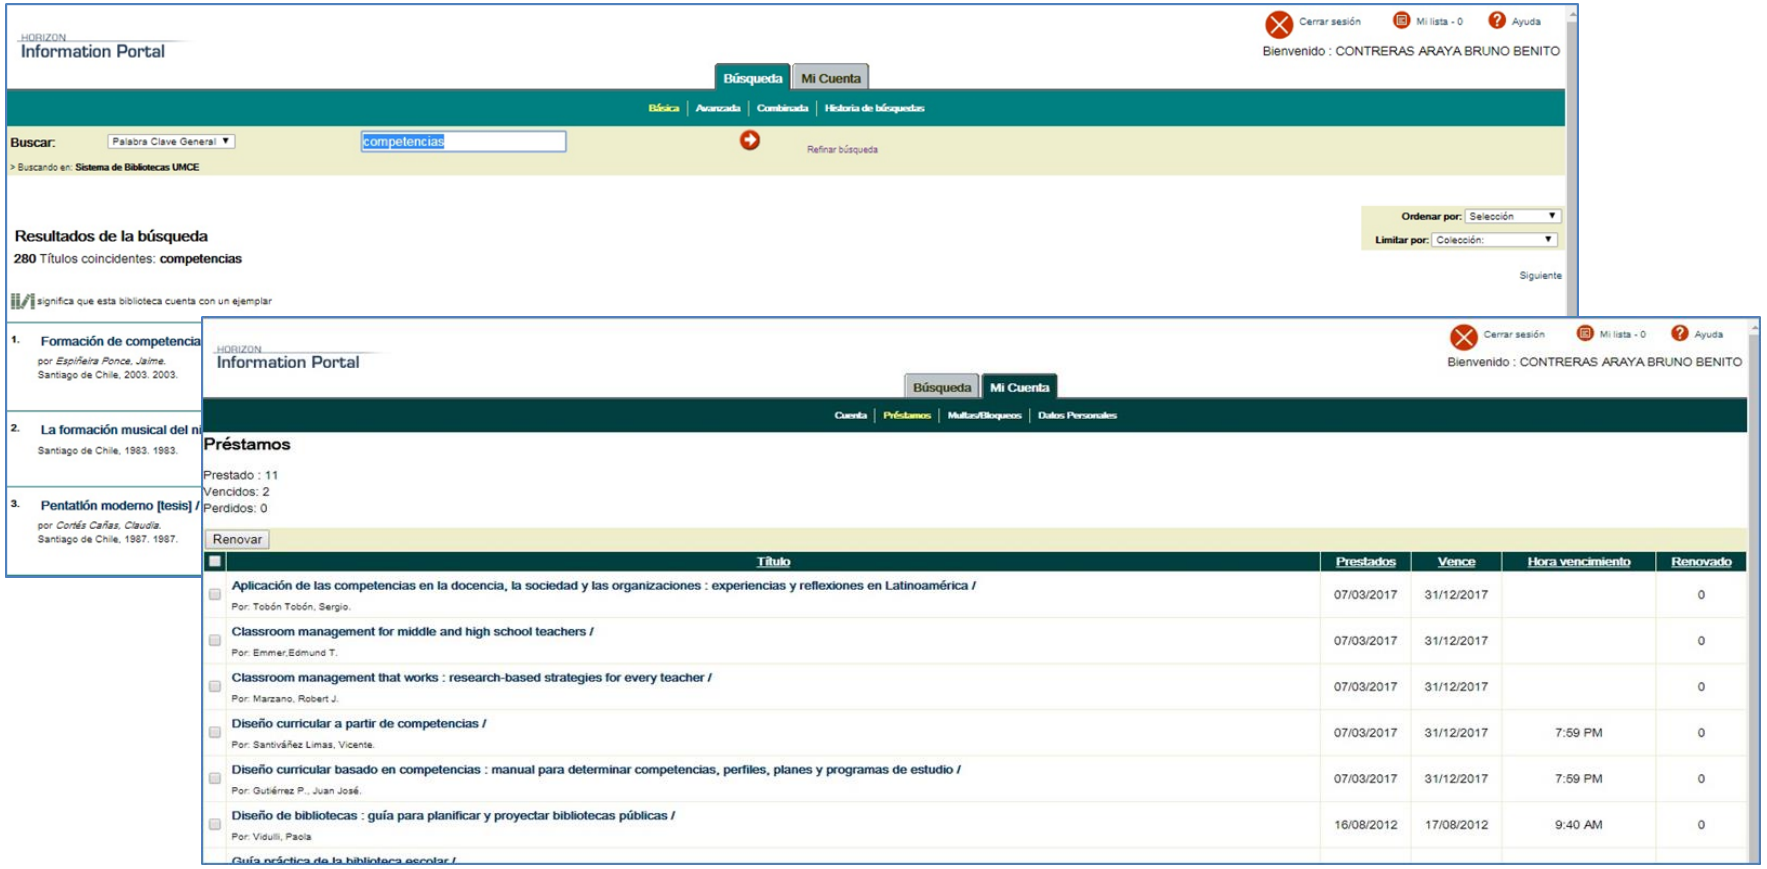

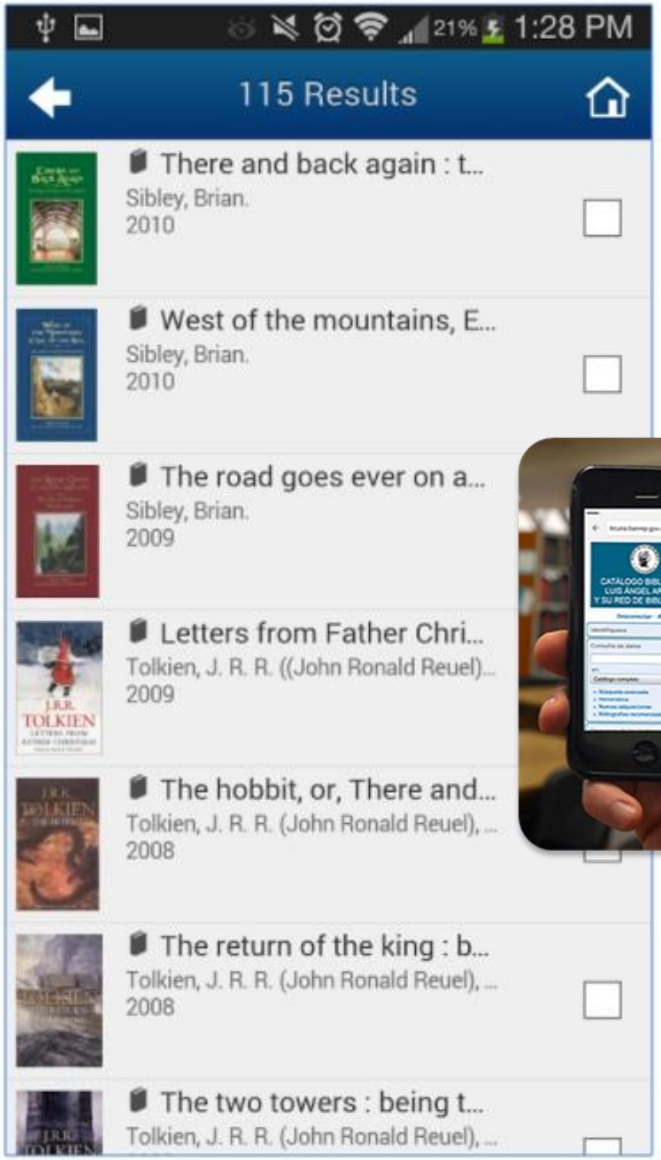
21% 1:28 PM
115 Results
There and back again : t...
Sibley, Brian.
2010
West of the mountains, E...
Sibley, Brian.
2010
The road goes ever on a...
Sibley, Brian.
2009
Letters from Father Chri...
Tolkien, J. R. R. ((John Ronald Reuel)...
2009
The hobbit, or, There and...
Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), ...
2008
The return of the king : b...
Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), ...
2008
The two towers : being t...
Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), ...



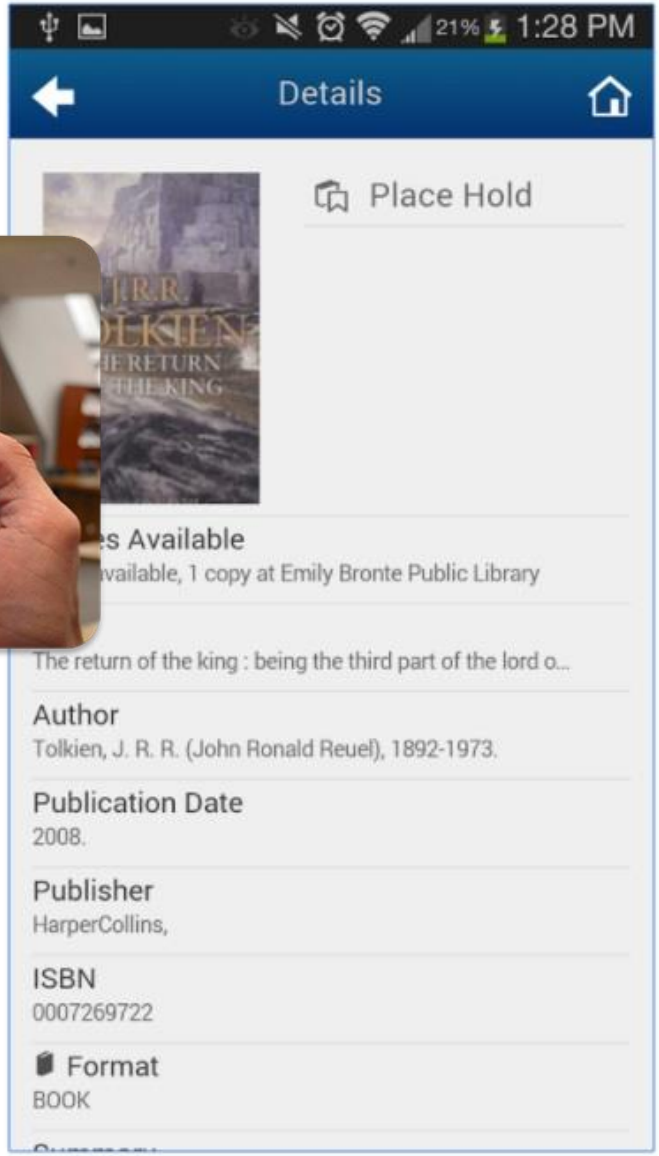
21% 1:28 PM
Details
Place Hold
s Available
vailable, 1 copy at Emily Bronte Public Library
The return of the king : being the third part of the lord o...
Author
Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), 1892-1973.
Publication Date
2008.
Publisher
HarperCollins,
ISBN
0007269722
Format
BOOK

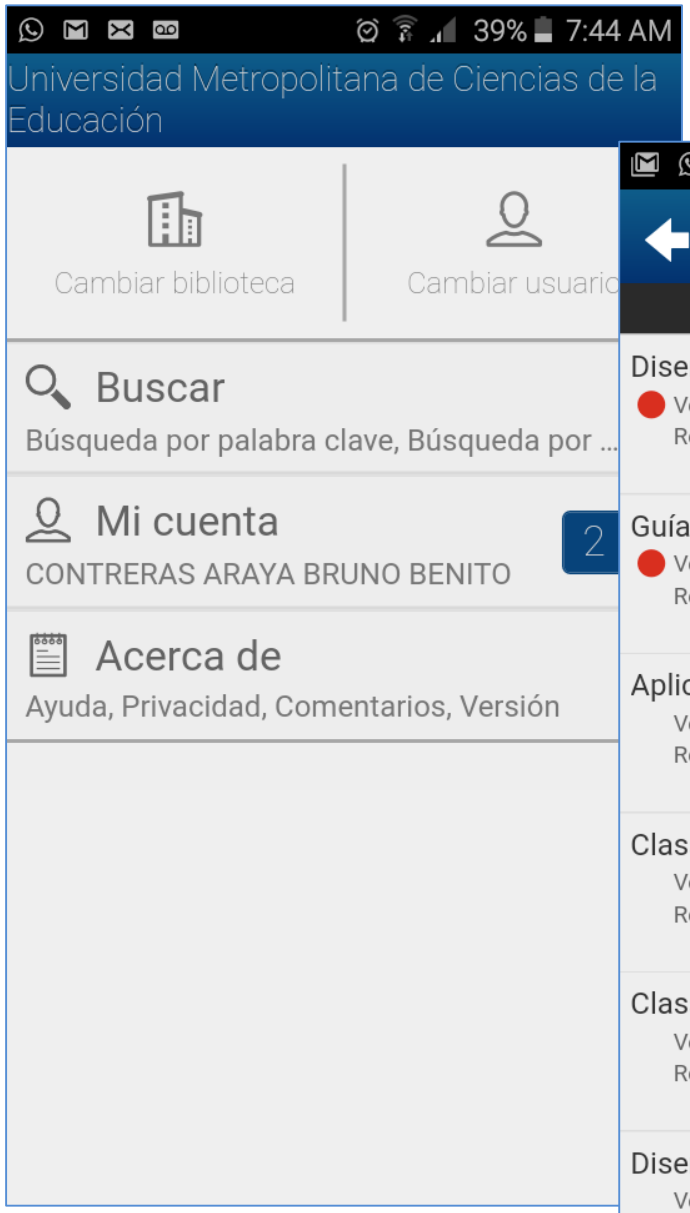
39% 7:44 AM
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Cambiar biblioteca
Cambiar usuario
Buscar
Búsqueda por palabra clave, Búsqueda por ...
Mi cuenta
CONTRERAS ARAYA BRUNO BENITO
2
Acerca de
Ayuda, Privacidad, Comentarios, Versión

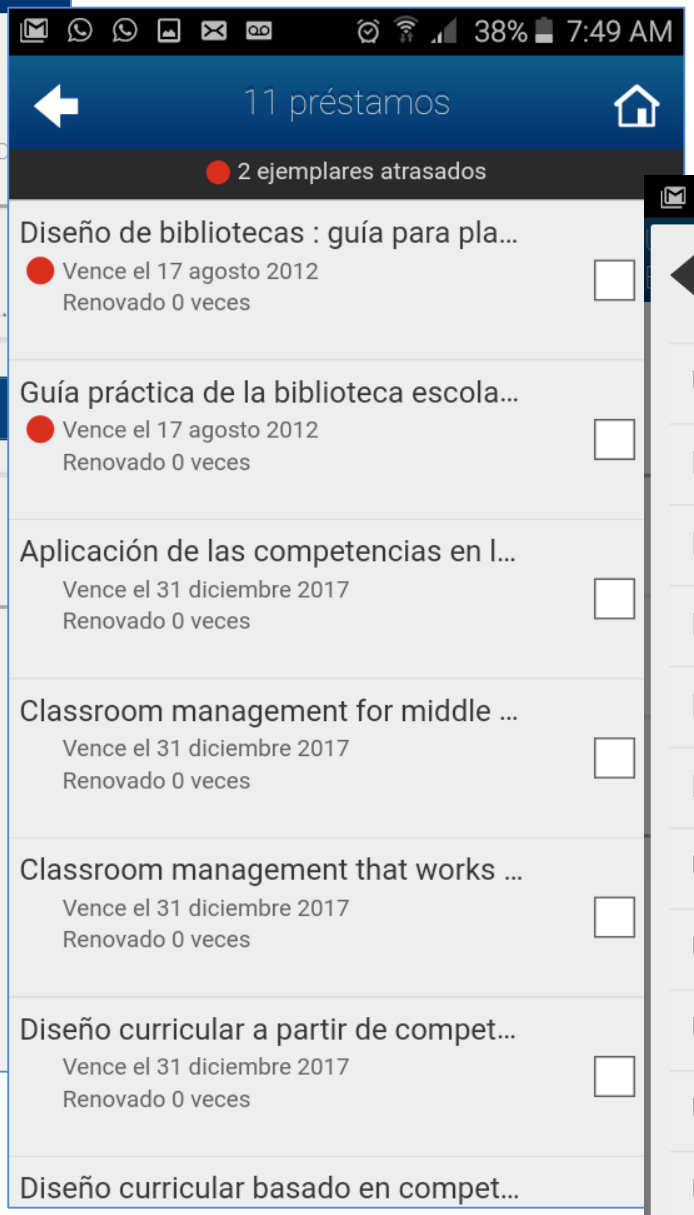
38% 7:49 AM
11 préstamos
2 ejemplares atrasados
Diseño de bibliotecas : guía para pla...
Vence el 17 agosto 2012
Renovado 0 veces
Guía práctica de la biblioteca escola...
Vence el 17 agosto 2012
Renovado 0 veces
Aplicación de las competencias en l...
Vence el 31 diciembre 2017
Renovado 0 veces
Classroom management for middle ...
Vence el 31 diciembre 2017
Renovado 0 veces
Classroom management that works ...
Vence el 31 diciembre 2017
Renovado 0 veces
Diseño curricular a partir de compet...
Vence el 31 diciembre 2017
Renovado 0 veces
Diseño curricular basado en compet...

33% 9:14 AM
Búsqueda por cercanía
Universidad Metropolitana de Cie...
Duoc UC Sede San Joaquín
Biblioteca Providencia
Duoc UC Sede Antonio Varas
Biblioteca Viva
Biblioteca Viva Alameda
Universidad de Chile
UNAB - Biblioteca Bellavista
UCEN- Biblioteca VKI
UCEN- Biblioteca VKI
UCEN - Biblioteca VKII

e-libro
Sistema de Bibliotecas UMCE
Inicio
Buscar
Mi Estantería
Español
Mis configuraciones | Iniciar sesión | Ayuda
Búsqueda simple
Buscar en ebrary
Avanzada
Todos los temas
Bienvenido a e-libro
Ver todos los títulos
Atención al Cliente y solución de problemas
Escríbanos un correo electrónico a: soporte@e-libro.com y ayuda@e-libro.com
Puede solicitar un entrenamiento virtual: Regístrese - Capacitaciones
Material de ayuda para descargar, visite la página de ayuda
App para iOs y Android
Aplicación BlueFire para iOS y Android que permite la lectura off-line de e-books
Algunas áreas temáticas:
Antropología
Ciencias de la Vida
Ciencias Físicas
Ciencias Políticas & Leyes
Ciencias Sociales
Economía & Negocios
Educación
Historia
Informática & Computación
Ingeniería & Tecnología
Lenguaje & Literatura
Medicina
Psicología
Religión
Google play
Comenzando

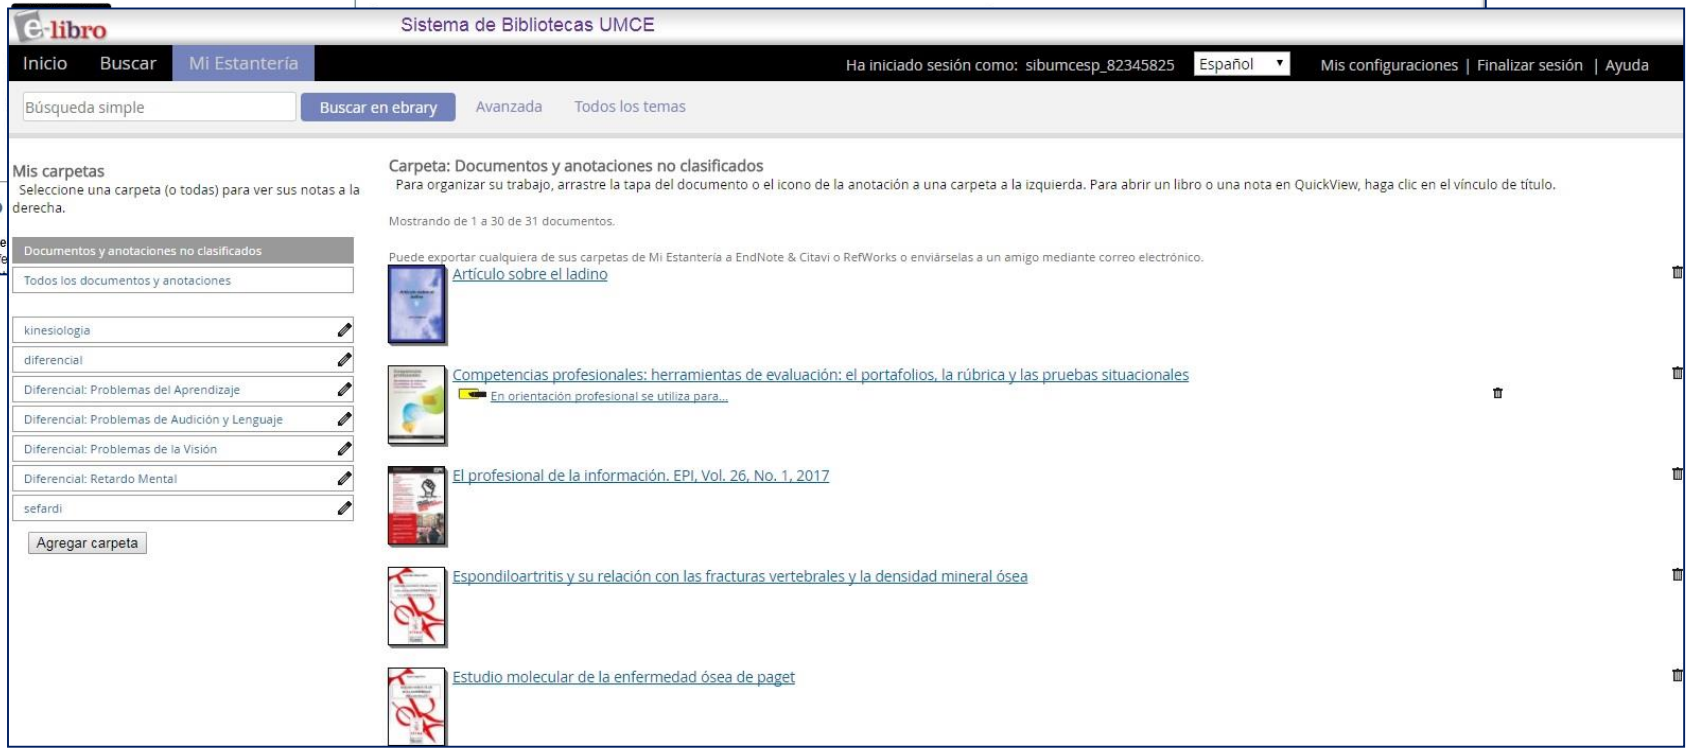
e-libro
Sistema de Bibliotecas UMCE
Inicio
Buscar
Mi Estantería
Ha iniciado sesión como: sibumcesp_82345825
Español
Mis configuraciones | Finalizar sesión | Ayuda
Búsqueda simple
Buscar en ebrary
Avanzada
Todos los temas
Mis carpetas
Seleccione una carpeta (o todas) para ver sus notas a la derecha.
Documentos y anotaciones no clasificados
Todos los documentos y anotaciones
kinesiologia
diferencial
Diferencial: Problemas del Aprendizaje
Diferencial: Problemas de Audición y Lenguaje
Diferencial: Problemas de la Visión
Diferencial: Retardo Mental
sefardi
Agregar carpeta
Carpeta: Documentos y anotaciones no clasificados
Para organizar su trabajo, arrastre la tapa del documento o el icono de la anotación a una carpeta a la izquierda. Para abrir un libro o una nota en QuickView, haga clic en el vínculo de título.
Mostrando de 1 a 30 de 31 documentos.
Puede exportar cualquiera de sus carpetas de Mi Estantería a EndNote & Citavi o RefWorks o enviárselas a un amigo mediante correo electrónico.
Artículo sobre el ladino
Competencias profesionales: herramientas de evaluación: el portafolios, la rúbrica y las pruebas situacionales
En orientación profesional se utiliza para...
El profesional de la información. EPI, Vol. 26, No. 1, 2017
Espondiloartritis y su relación con las fracturas vertebrales y la densidad mineral ósea
Estudio molecular de la enfermedad ósea de paget

Se muestran 1 - 20 de 7,363 documentos

Est hic varia lectio: la lectura en el mundo antiguo
Autor: Fernández Álvarez, María Pilar Fernández Vallina, Emiliano Martínez Manzano, Teresa
Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca
Fecha de Publicación: 2008
Temas: Reading. Civilization, Classical. Lectura. Civilización antigua.
Tabla de Contenidos | Descargar | EndNote & Citavi | RefWorks | Add to Bookshelf

¿Una pedagogía distinta? Cambios paradigmáticos en el proceso educativo
Autor: Montes Mendoza, Rosa Isabel
Editorial: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
Fecha de Publicación: 2001
Temas: Multimedia systems. Mass media. Technology. Education. Educación. Tecnología. Medios de comunicación. Multimedios.
Tabla de Contenidos | Descargar | EndNote & Citavi | RefWorks | Add to Bookshelf

Los retos en la educación del siglo XXI
Autor: Matute, Esmeralda Romo Beltrán, Rosa Martha
Editorial: Universidad de Guadalajara
Fecha de Publicación: 07/2001
Temas: Education -- Mexico. Educación. México.
Tabla de Contenidos | Descargar | EndNote & Citavi | RefWorks | Add to Bookshelf

Transformar para educar: cambio magistral 1
Autor: Castro, Adela de
Editorial: Universidad del Norte
Fecha de Publicación: 07/2015
Temas: Education -- Latin America. Educación -- América Latina. Education and state -- Latin America. Educación y Estado -- América Latina.
Tabla de Contenidos | Descargar | EndNote & Citavi | RefWorks | Add to Bookshelf

Report Name	Title Report
Channel	Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - elibro ASP(sibumcesp)
Document Collections	All
Time Period	2016-06-12 to 2017-06-12

¡Quiero publicar mi libro!	LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES
¿Cómo no temblar?. Acta Poética, Vol.30, No 2, 2009	LITERARY CRITICISM
¿Una pedagogía distinta? Cambios paradigmáticos en el proceso educativo	EDUCATION
Acario: el músico mágico	LITERARY CRITICISM
Acciones y reacciones estratégicas adaptaciones de las FARC a las innovaciones operacionales de las Fuerzas Arma	POLITICAL SCIENCE
Agua para todos: gestión participativa como expresión de intereses y necesidades sociales	NATURE
Anotaciones para una teoría del fracaso	PHILOSOPHY
Aprendizaje de la ciencia: constructivismo social y eliminación de los procesos cognitivos	EDUCATION
Biología general	SCIENCE
Bohemios en París: epistolario de artistas chilenos en Europa 1900-1940	SOCIAL SCIENCE
Cálculo infinitesimal de varias variables (2a. ed.)	MATHEMATICS
Cálculo: apuntes de teoría y ejercicios resueltos	MATHEMATICS
Carmilla	LITERARY COLLECTIONS
Ciclos de tiempo y significado en los libros mexicanos del destino	SOCIAL SCIENCE
Ciudades y territorio en América del Sur, del siglo XV al XVII	ARCHITECTURE
Cómo construir sociedades: diez cosas que nunca nos dicen sobre la paz y la guerra	POLITICAL SCIENCE
Como debe ser el deporte y la recreación en las universidades del país	SPORTS & RECREATION

EDUCATION	Educational Policy & Refo	2	
EDUCATION	Educational Psychology	13	
EDUCATION	Elementary	3	
EDUCATION	Evaluation & Assessment	7	
EDUCATION	Experimental Methods	2	
EDUCATION	General	88	
EDUCATION	Higher	42	
EDUCATION	Physical Education	20	
EDUCATION	Special Education / Comm	5	
EDUCATION	Training & Certification	7	
HISTORY	Ancient / Rome	2	
HISTORY	Asia / China	12	
HISTORY	Europe / General	5	
HISTORY	Europe / Spain & Portugal	4	
HISTORY	General	26	
HISTORY	Latin America / General	3	
HISTORY	Latin America / Mexico	5	
HISTORY	Military / General	14	
HISTORY	Military / Strategy	10	
LANGUAGE ARTS & DISCIP	Library & Information Scie	6	
LANGUAGE ARTS & DISCIP	Publishing	10	
LAW	Criminal Procedure	10	
LITERARY COLLECTIONS	Essays	29	
LITERARY COLLECTIONS	European / General	10	
LITERARY CRITICISM	American / General	5	
LITERARY CRITICISM	Ancient & Classical	0	

Objetivo Específico 2: Mejorar y fortalecer las instalaciones y el equipamiento de nuestra biblioteca central mediante un plan de ampliación para habilitar una sala múltiple que propicie el aumento de la calidad del servicio, mejorando los espacios como centro de acogida y estudio, adaptándolos para las necesidades de los estudiantes de primeros quintiles que provienen de comunas alejadas que necesitan permanecer todo el día en el Campus Universitario.

Hitos – Objetivo Específico 2

Descripción Hito / Actividades (según formulación del Proyecto)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en Proyecto		Fecha cumplimiento EFECTIVA o REPROGRAMADA		Logrado a la fecha de término Señalar: SI, NO	Medios de Verificación adjuntos al presente informe (indicar el número de anexo correspondiente)
	SEMESTRE 1 (marcar cuando corresponda)	SEMESTRE 2 (marcar cuando corresponda)	SEMESTRE 1 (marcar cuando corresponda)	SEMESTRE 2 (marcar cuando corresponda)		
HITO **Construcción y habilitación de ampliación de espacios de la Biblioteca Central recepcionada**						
- **Actividad** **Presentación y aprobación del anteproyecto de arquitectura o construcción**	X		X		SI	Anteproyecto de Arquitectura
- **Actividad** **Elaboración del proyecto arquitectónico de ampliación**	X		X		SI	Proyecto de ampliación
- **Actividad** **Presentación a la Dirección de Obras Municipales para obtener permiso ampliación**	X		X		SI	Entrega de proyecto de ampliación a Dirección de Obras Municipales
- **Actividad** **Elaboración de bases administrativas y técnicas**	X		X		SI	Bases de licitación proyecto ampliación
- **Actividad** **Convocatoria a licitación pública a empresas constructoras**	X			X	SI	Publicación llamado a licitación pública en Portal Chilecompras
- **Actividad** **Adjudicación de la propuesta**	X			X	SI	Propuesta adjudicada en Portal Chilecompras
- **Actividad** **Firma del contrato e inicio de obras de ampliación**	X			X	SI	Contrato suscrito con empresa adjudicada
- **Actividad** **Recepción de obra y trabajos 280m2, construidos en terraza tercer piso de Biblioteca Central**		X		X	SI	Informe recepción conforme Arquitecto y dirección de Obras municipales
- **Actividad** **Definición, adquisición y habilitación de mobiliario y recursos tecnológicos en nueva ampliación**	X	X			NO	Detalle mobiliario subido a portal Chilecompras

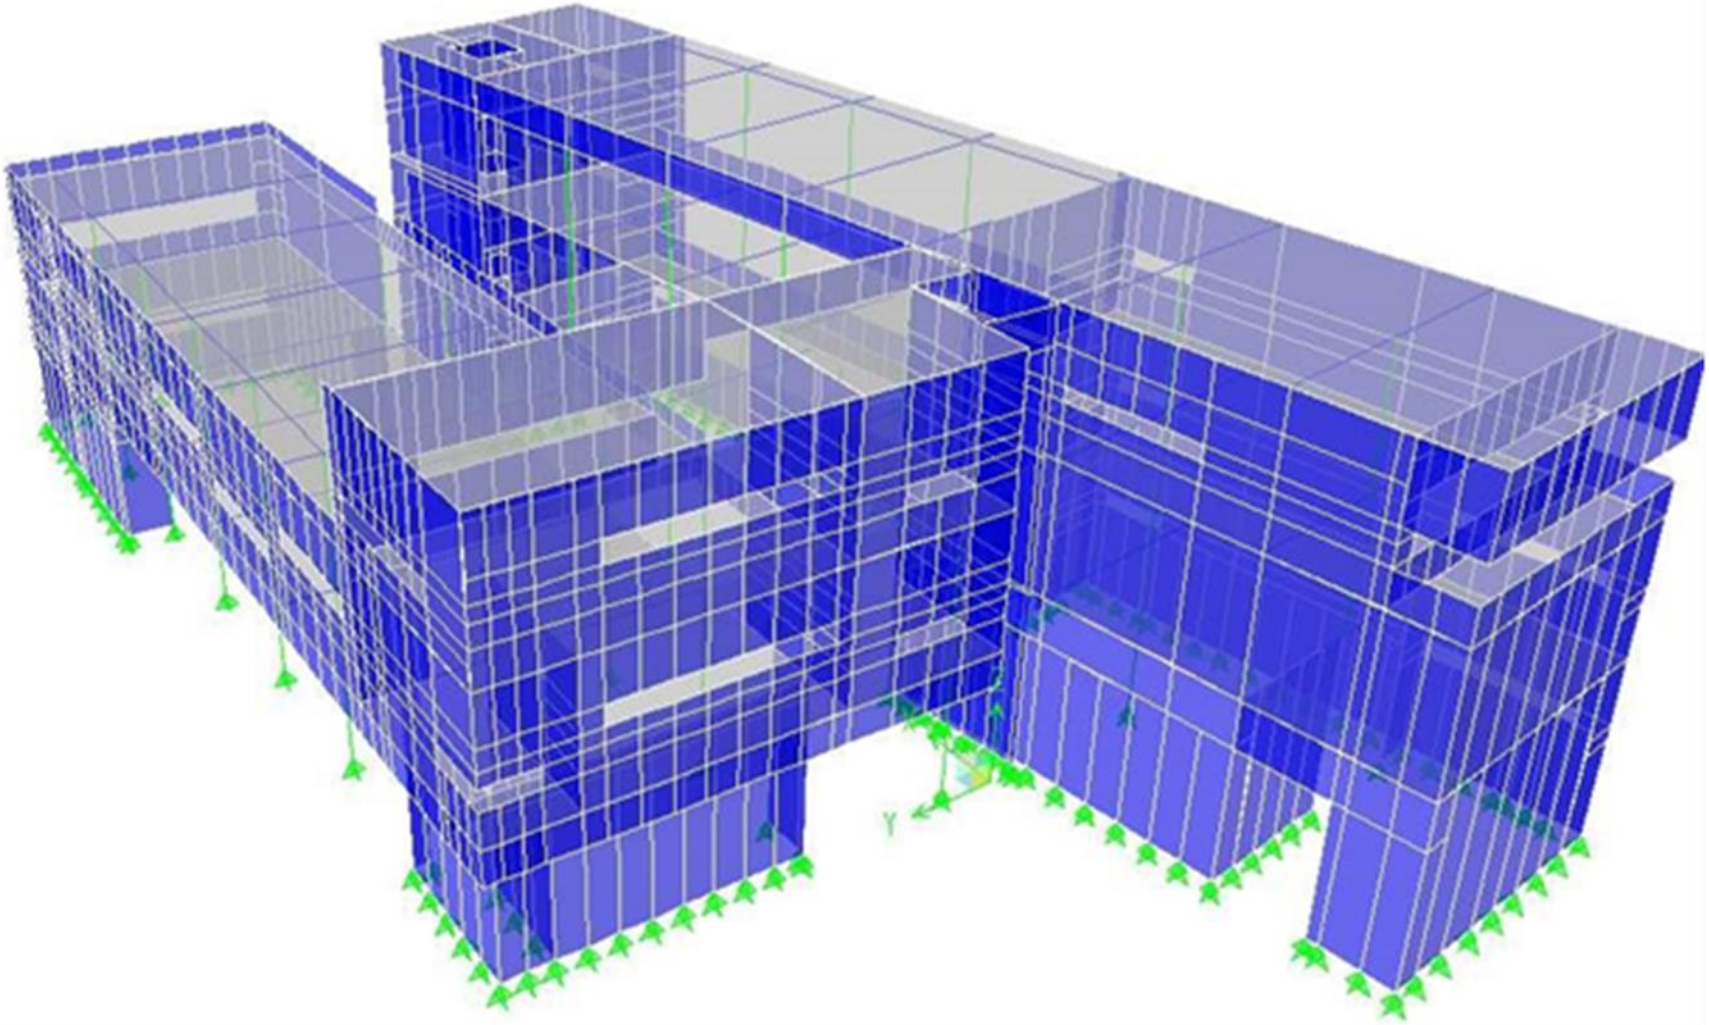
Y

Análisis cualitativo del avance del Objetivo Específico 2:

Ampliación propuesta de 280 m2 finalizó en buenos términos, dotando a Biblioteca de una sala de lectura, sala de eventos, laboratorio para restauración de material bibliográfico valioso, un área de trabajo, bodega y una terraza de esparcimiento.

Mobiliario no se incorporó a la planilla de ítem de gastos, por lo tanto la adquisición se realiza con recursos de la Universidad.

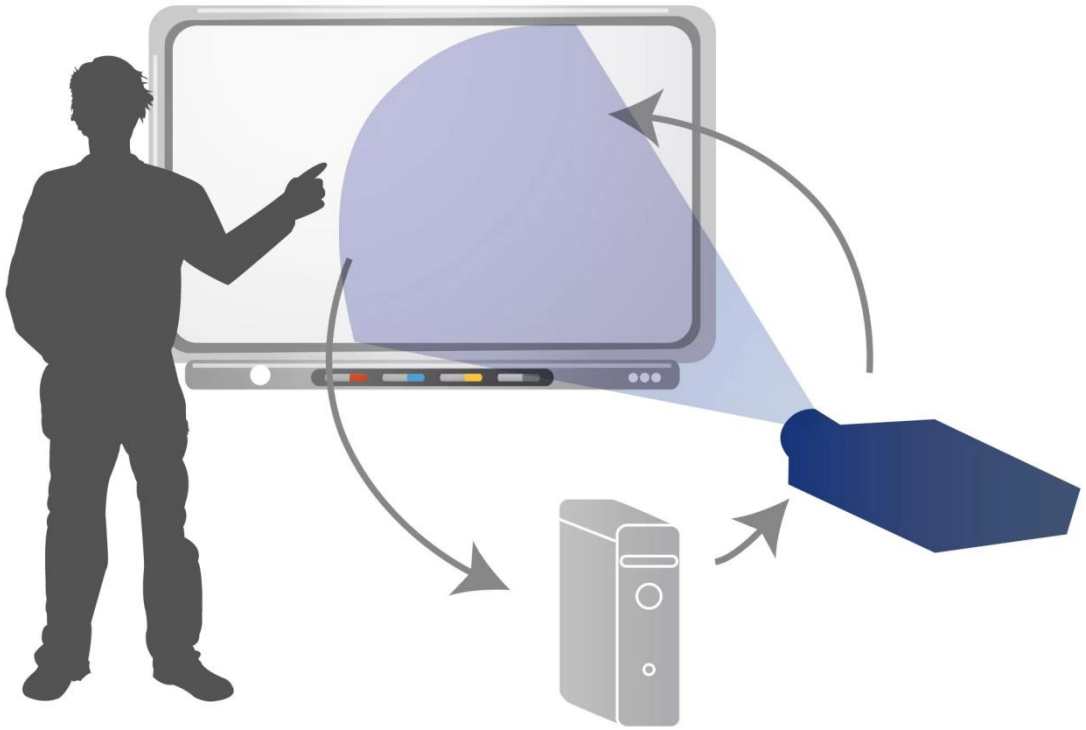

Cumplimiento de indicadores, a la fecha de término de la ejecución del Proyecto

Indicadores					
N°	Nombre Indicador	Valor Base	Valor meta comprometido	Valor Efectivo (numerador/ denominador)	Cumplimiento (SI,NO); Medios de Verificación definidos por Proyecto
1.	Títulos de libros electrónicos	150	500	30.000	SI
2.	Acceso a libros electrónicos	94	2350	1.274	SI
3.	Porcentaje de m^2 construidos de salas de estudio	17% (357/2.100)	27% (637/2.380)	27% (637/2.380)	SI
4.	Aumento del uso de salas de estudio	29.303	39.000		NO
5.	Acceso al catálogo electrónico	1 54.000/54.000	1,85 100.000/54.000	1,8 96.297	SI
6.	Bibliotecas conectadas	1 (2/2)	3 (6/2)	4 (5/2)	SI

Análisis cualitativo del avance de indicadores

Indicador 1: Al inicio consideramos contratar acceso a 500 títulos de libros electrónicos, se ha logrado contratar una plataforma de 30.000 títulos, de las cuales 3.000 son de la especialidad educación.
Indicador 2: Preveíamos 2.350 bajadas de libros desde la plataforma en un periodo lectivo de 8 meses, sin embargo a tan solo 1 mes de conexión ya se han realizado 1.274 bajadas de textos especializados lo que redunda en un impacto en el uso y satisfacción de los usuarios.
Indicador 3: El porcentaje de ampliación de salas de estudio y el área permitió además incluir en la construcción un laboratorio para restauración, bodega y oficina para el personal profesional que coordinará las actividades y servicios de la nueva dependencia.
Indicador 4: De acuerdo a la fecha en que se finalizó (mayo 2017) la construcción de las salas de estudio, aún no nos permite medir el uso.
Indicador 5: A pesar que se pronosticó un aumento de 100.000 accesos al catálogo electrónico bajo la nueva plataforma adquirida, teniendo un valor efectivo a la fecha de 96.297 se debe tomar en cuenta el lapso de tiempo breve que se realizó la medición (marzo a mayo 2017).
Indicador 6: Comprometimos conectar al nuevo sistema 3 bibliotecas departamentales, lográndose un valor efectivo de 4 bibliotecas, además con una proyección de conexión de todas las 6 bibliotecas sectoriales.

Resumen ejecución de recursos del Proyecto ($ Nominales)

MECESUP2 Informe de Proyecto

Ítem	(1) Presupuesto Vigente $			(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 01/04/2017						(1-2) Saldo Presupuestario $ Al 01/04/2017		
				Mineduc			Institución					
	Mineduc	Institución	Total	(a) EFECTIVO	(b) POR PAGAR	(c = a+b) DEVENGADO	(d) EFECTIVO	(e) POR PAGAR	(f = d+e) DEVENGADO	Mineduc	Institución	Total
Obras (ampliaciones, habilitaciones)	74.300.000	15.000.000	89.300.000	0	74.300.000	74.300.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
Bienes (máquinas, equipos, mobiliario, Software y licencias bibliografía, equipamiento audiovisual)	41.126.000	30.283.000	71.409.000	8.930.756	22.858.369	31.789.125	12.159.192	850.000	13.009.192	9.336.875	17.273.808	26.610.683
Material de enseñanza	2.124.000	1.152.000	3.276.000	0	0	0	0	0	0	2.124.000	1.152.000	3.276.000
Consultorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Humanos (honorarios , sueldos, etc)	3.500.000	4.000.000	7.500.000	0	0	0	499.964	2.794.444	3.294.408	3.500.000	705.592	4.205.591
Servicios de no consultorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formación Académica (Estadías, visitas de especialistas, pasantías, movilidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Operacionales (reuniones rutinarias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión académica (talleres, difusión, materiales oficina, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total $	121.050.000	50.435.000	171.485.000	8.930.756	97.158.369	106.089.125	12.659.156	18.644.444	31.303.600	14.960.875	19.131.400	34.092.275

Cuadro de gastos comprometidos

Ítem/Gasto comprometido	$ totales	N° pagos	Mes o período de pago (mes/año) o (mes/año: inicio, término)	Fecha documento
Ítem Obras				
Gasto 1: Remodelación y ampliación Biblioteca Central	89.300.000	2	Abril/2017 – junio/2017	31/01/2017
Total gasto ítem	89.300.000			
Ítem Bienes				
Gasto 1: 5 Scanner	276.981	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 2: Impresora, discos, cámaras	971.292	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 3: Impresora térmica	823.749	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 4: 6 Notebook	2.464.564	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 5: 2 Lectores código de barras óptico	1.021.051	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 6: 3 Lectores código de barras	157.558	1	Mayo 2017	01/08/2016
Gasto 7: 3 Impresora matriz de punto	716.032	1	Junio 2017	01/08/2016
Gasto 8: 2 Proyectores multimedia	693.887	1	Junio 2017	01/08/2016
Gasto 9: 2 Pizarras interactivas	3.307.894	1	Junio 2017	20/10/2016
Gasto 10: Portales de seguridad	4.593.400	1	Junio 2017	01/08/2016
Gasto 11: 2 lockers estudiantes	2.253.961	1	Junio 2017	06/06/2016
Gasto 12: Software Deep Freeze	1.620.000	1	Julio 2017	27/07/2016
Gasto 13: Software Plataforma Dspace	4.500.000	1	Julio 2017	06/06/2016
Gasto 14: Licencia herramientas pizarra smartboard	308.000	1	Julio 2017	19/07/2016
Total gasto ítem	23.708.369			
Item Honorarios				
Gasto 1: Pedro Parra Camilla. Ingeniero desarrollo proyecto arquitectura	1.944.444		Pagado por UMCE. Se regularizará en Junio 2017	28/11/2016
Gasto 2: Revisión proyecto cálculo y revisión gestión municipal	850.000		Junio 2017	19/10/2016
Total gasto ítem	2.794.444			
Total comprometido	115.802.813			

Aspectos relevantes sobre implementación del Proyecto

Logros alcanzados del Proyecto

Plataforma computacional implementada:
La nueva plataforma de gestión de biblioteca ha permitido actualizar los procesos administrativos de biblioteca, además lograr la conexión de 4 bibliotecas departamentales al sistema central y logrando así modernizar los préstamos, devolución y consultas.

Recursos de información en línea implementados:
Al inicio consideramos contratar acceso a 500 títulos de libros electrónicos, se ha logrado contratar una plataforma de 30.000 títulos, de las cuales 3.000 son de la especialidad educación.
Consideramos 2.350 bajadas de libros desde la plataforma en un periodo lectivo de 8 meses, sin embargo a tan solo 1 mes de conexión ya se han realizado 1.274 bajadas de textos especializados.

Construcción y habilitación de ampliación de espacios de la Biblioteca Central:
Se proyectó ampliar los espacios para alumnos en dos cómodas dependencias con tecnología incorporada. El Proyecto permitió agregar: laboratorio para restauración de material bibliográfico valioso, oficina para el encargado de coordinar las actividades y tareas de las nuevas dependencias y servicios, bodega y una terraza de esparcimiento.

Mecanismos de sustentabilidad e institucionalización de acciones del Proyecto.
Es importante y prioritario que los nuevos servicios bibliográficos en línea se incorporen como un ítem permanente y estratégico en el presupuesto de Biblioteca.

Dificultades para el avance
El sistema de adquisiciones de la universidad debe mejorar y desburocratizar los procesos, pues dificulta el avance y desarrollo de los proyectos, resultado de esto, no se completó la compra de algunos recursos considerados para el proyecto.

Desafíos
El proyecto en su componente Ampliación de Infraestructura, permitirá coordinar actividades de enseñanza-aprendizaje con las distintas facultades de la Universidad, lo que obliga a la Biblioteca a extender y expandir sus servicios.

En relación al componente Modernización de los Servicios Bibliográficos en su logro contratación de plataforma de libros electrónicos y repositorio universitario de información; constituye un cambio importante en la actitud tradicional de enseñanza de los académicos de la UMCE, lo que hace que biblioteca sea un apoyo en TIC esencial a las asignaturas y cátedras de las distintas carreras de la universidad. Biblioteca deberá generar inducciones y talleres en el uso y aplicación de este y otros servicios similares.

revistas.umce.cl

UMCE
Portal de Revistas Académicas

Inicio Acerca de Iniciar sesión Registrarse Buscar

> Portal Oficial de Revistas Académicas de la UMCE

Portal Oficial de Revistas Académicas de la UMCE

Revista Electrónica Diálogos Educativos

La Revista Electrónica Diálogos Educativos, del Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad, es una de nuestras publicaciones más importantes en el cumplimiento de esta misión. Su objetivo es constituir un espacio de reflexión para la generación de conocimiento científico, la definición de políticas educativas y la mejora de prácticas pedagógicas, en áreas como: saberes escolares, saberes de las disciplinas escolares, procesos de aprendizaje, de enseñanza, metodología y didácticas generales y específicas, evaluación, gestión educacional, TIC, formación docente, Epistemología y Sociología de la educación.

VER REVISTA | NÚMERO ACTUAL | REGISTRARSE

Educación y Tecnología

Revista centrada en la publicación de artículos de investigación referentes al uso de tecnologías en la educación.

VER REVISTA | NÚMERO ACTUAL | REGISTRARSE

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Servicio de ayuda de la revista

USUARIO/A
Nombre de usuario/a
Contraseña
No cerrar sesión
Iniciar sesión

IDIOMA
Escoge idioma
Español (España) Entregar

CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Ámbito de la búsqueda

Contextos

Inicio Acerca de Iniciar sesión Buscar Actual Archivos

Inicio > Núm. 35 (2016)

Contextos

La revista *Contextos*, Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales es una publicación semestral, editada de forma ininterrumpida por la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación desde 1998. Su principal misión es la difusión de trabajos en los que se discuta, analice y reflexione en torno a la literatura, lenguaje, filosofía, artes plásticas, música, comunicación, historia, geografía y semiología.

Núm. 35 (2016)

Tabla de contenidos

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Servicio de ayuda de la revista

USUARIO/A
Nombre de usuario/a
Contraseña
No cerrar sesión
Iniciar sesión

NOTIFICACIONES
- Vista
- Suscribirse

CONTENIDO DE LA REVISTA
Buscar
Ámbito de la búsqueda
Todo
Buscar

Examinar
- Por número
- Por autor/a
- Por título
- Otras revistas

library.cgi
English Lesson: Perso
aoasg.files.wordpress
Frases de amor en In
Web Resizer - dismin
Biblioteca UMCE
Blogger: Se ha cerrad
Casa
4shared.com - almac
AYUDA
PREFERENCIAS
Sibumce Digital
Biblioteca digital de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
SISTEMA DE BIBLIOTECAS UMCE
Seleccione una Colección
Archivo UMCE
Cuadernos de la Facultad
Tesis UMCE


cuadernos de la facultad
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS
COLECCIÓN
MONOGRAFÍA TEMÁTICA 2000
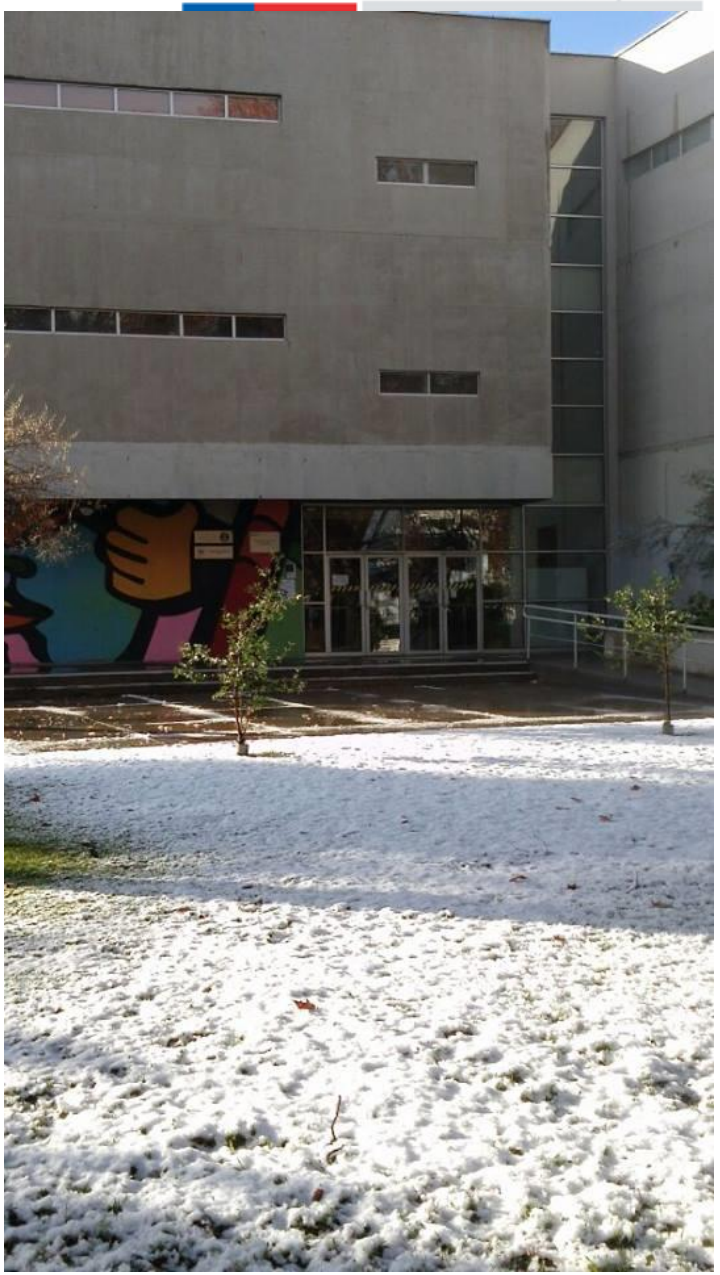
Gracias por su atención
